Bauablaufplan Mannheim Planken
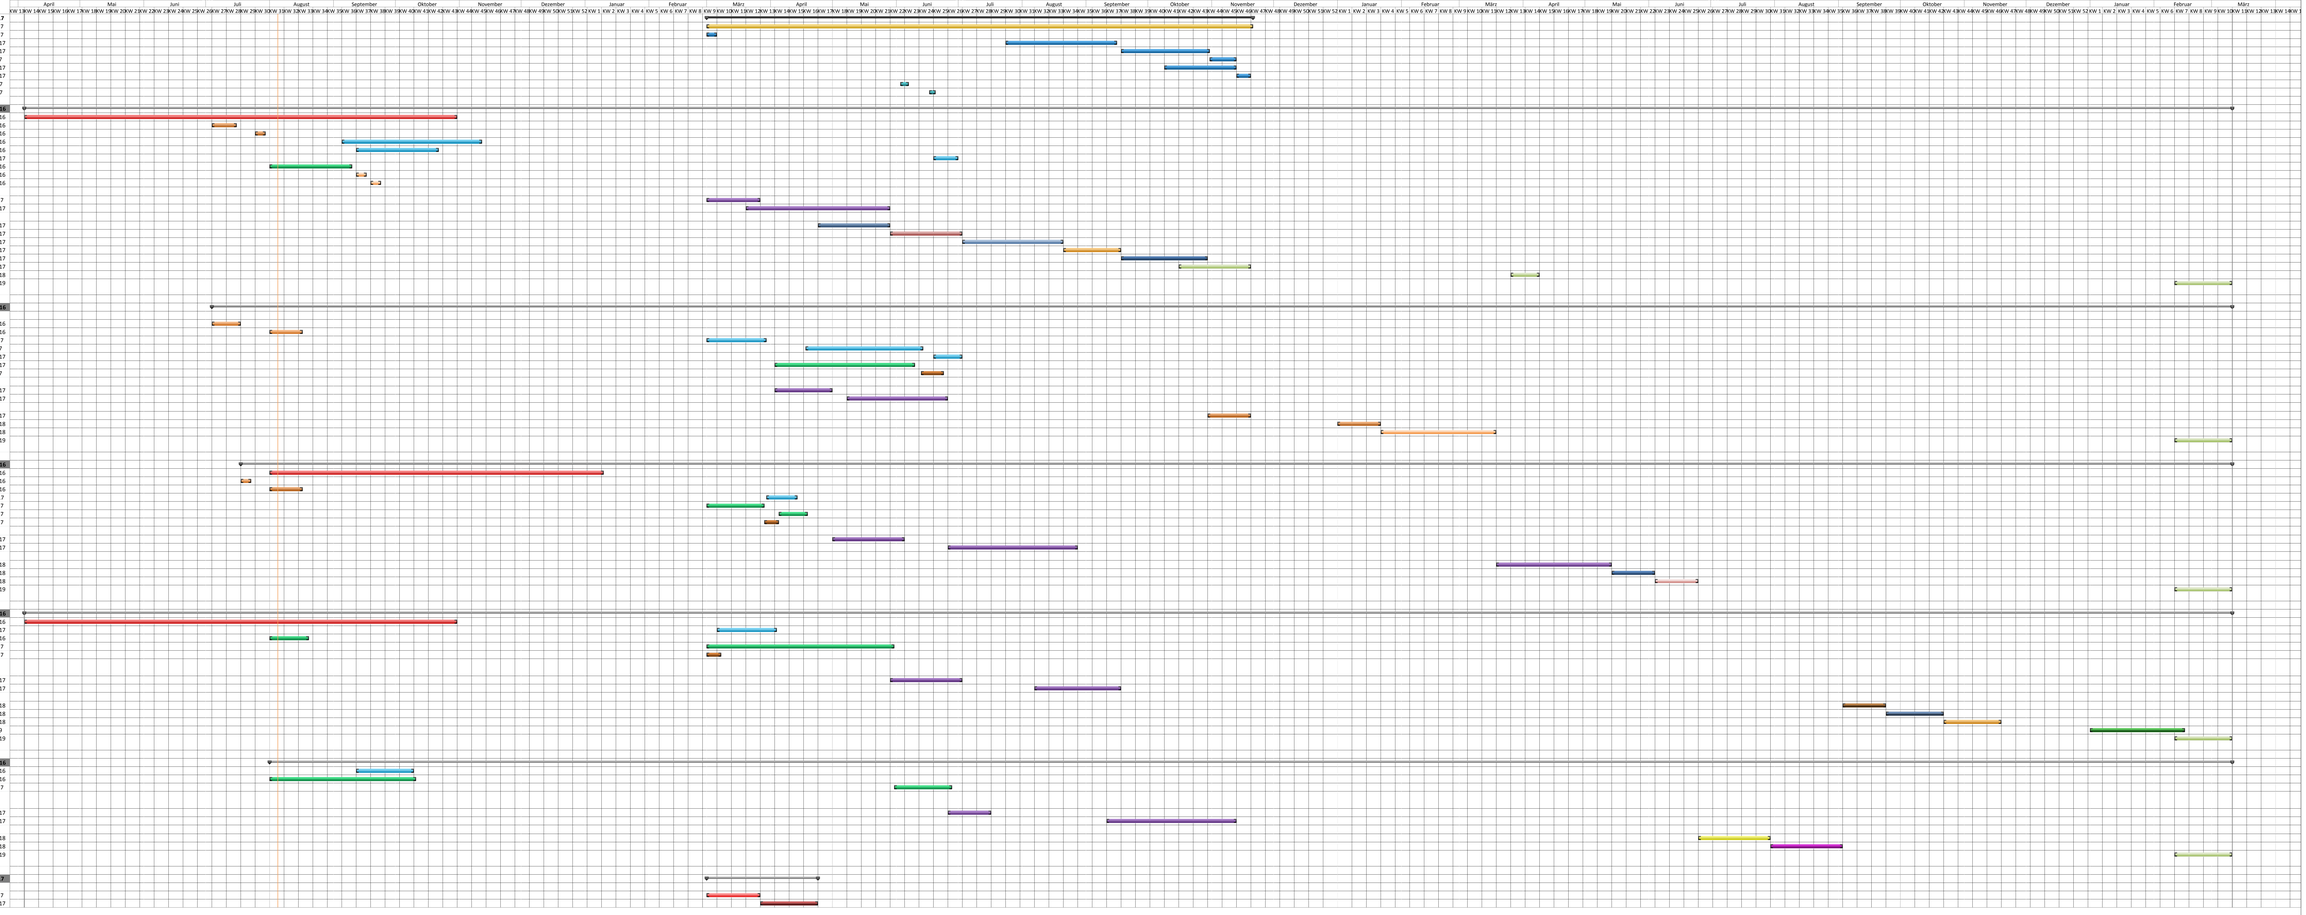
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang
1	**RNV**	**188 Tage**	**Mi 01.03.17**
2	Betriebssperre	189 Tage	Mi 01.03.17
3	Rückbau Fahrleitung	4 Tage	Mi 01.03.17
4	Maste erstellen	40 Tage	Mo 24.07.17
5	Montage Fahrleitung	31 Tage	Mo 18.09.17
6	Zuschaltung / Kontrollmaßnahme	10 Tage	Di 31.10.17
7	Mobiliar (alle Haltestellen)	26 Tage	Mo 09.10.17
8	Probebetrieb	6 Tage	Mo 13.11.17
9	Gleisbogenerneuerung Kaiserring - Umbauwochenende 1	3 Tage	Sa 03.06.17
10	Gleisbogenerneuerung Kaiserring - Umbauwochenende 2	2 Tage	Sa 17.06.17
11			
12	**Baufeld A L= 150**	**675 Tage?**	**Mo 04.04.16**
13	Kanal P 7 / O 7	151 Tage	Mo 04.04.16
14	Stopfarbeiten vor O 7	10 Tage	Mo 04.07.16
15	Stopfarbeiten P 7	5 Tage	Mo 25.07.16
16	Wasser (P7, Münzgasse)	50 Tage	Mo 05.09.16
17	Wasser (O 7 / 13)	30 Tage	Mo 12.09.16
18	Wasser, Rückbau Provisorium, HDPE, Bereich P 7 / 17	10 Tage	Mo 19.06.17
19	Fernwärme (O 7 / O 13)	30 Tage	Mo 01.08.16
20	Gas O 7	5 Tage	Mo 12.09.16
21	Gas P 7	5 Tage	Mo 19.09.16
22	**Stadtbahnanlage (Gleis+Hst.) (P 7, O 7)**		
23	Gründung Fahrleitungsmaste (P 7, O 7)	19 Tage	Mi 01.03.17
24	Gleisarbeiten (P 7, O 7)	51 Tage	Mo 20.03.17
25	**Strom + Oberfläche (P 7, O 7)**		
26	Baufeld 3 (Vorfläche)	26 Tage	Mo 24.04.17
27	Baufeld 4 (O 7)	26 Tage	Mo 29.05.17
28	Baufeld 5 (Vorfläche)	36 Tage	Mo 03.07.17
29	Baufeld 6 (P 7)	21 Tage	Mo 21.08.17
30	Baufeld 7 (P 7)	31 Tage	Mo 18.09.17
31	Landschaftsbau (Grünarbeiten) O 7 / P 7	26 Tage	Mo 16.10.17
32	Landschaftsbau (Grünarbeiten) O 7 / P 7	11 Tage	Mo 26.03.18
33	Baumbepflanzungen u. Anbringen Baumschutz für Neupflanzungen O 1 / P 1 bis O 7 / P 7	21 Tage	Mo 11.02.19
34			
35	**Baufeld B L= 170 m**	**610 Tage?**	**Mo 04.07.16**
36	Kanal		
37	Stopfarbeiten vor O 7	11 Tage	Mo 04.07.16
38	Stopfarbeiten P 6	12 Tage	Mo 01.08.16
39	Wasser (O 6)	21 Tage	Mi 01.03.17
40	Wasser (P 6 und Münzgasse)	41 Tage	Di 18.04.17
41	Wasser (P 7 / 17)	11 Tage	Mo 19.06.17
42	Fernwärme (O 6 / O 7 zu P 6 / P 7 und O 7 / 4)	50 Tage	Mo 03.04.17
43	Gas (O 6)	9 Tage	Di 13.06.17
44	**Stadtbahnanlage (Gleis+Hst.) (P 7, O 7, P 6, O 6)**		
45	Gründung Fahrleitungsmaste (P 7, O 7, P 6, O 6)	21 Tage	Mo 03.04.17
46	Gleisarbeiten (P 7, O 7, P 6, O 6)	36 Tage	Mo 08.05.17
47	**Strom + Oberfläche (P 7, P 6, O 7, O 6, Münzgasse)**		
48	Baufeld 8 (P 7) 2017	16 Tage	Mo 30.10.17
49	Baufeld 8 (P 7) 2018	16 Tage	Mo 01.01.18
50	Baufeld 9 (O 7, O 6) 2017	41 Tage	Mo 22.01.18
51	Baumpflanzungen u. Anbringen Baumschutz für Neupflanzungen	21 Tage	Mo 11.02.19
52			
53	**Baufeld C L= 110 m**	**608 Tage?**	**Mo 18.07.16**
54	Kanal O 6	86 Tage	Mo 01.08.16
55	Stopfarbeiten O 5	5 Tage	Mo 18.07.16
56	Stopfarbeiten P 6	12 Tage	Mo 01.08.16
57	Wasser (P 5)	11 Tage	Do 30.03.17
58	Fernwärme (O 4 / O 5, P 4 / P 5)	20 Tage	Mi 01.03.17
59	Fernwärme (O 4 / O 5)	10 Tage	Mi 05.04.17
60	Gas (O 4 / P 4 / 6)	5 Tage	Mi 29.03.17
61	**Stadtbahnanlage (Gleis+Hst.) (P 6, O 6, P 5, O 5)**		
62	Gründung Fahrleitungsmaste (P 6, O 6, P 5, O 5)	26 Tage	Mo 01.05.17
63	Gleisarbeiten (P 6, O 6, P 5, O 5)	46 Tage	Mo 26.06.17
64	**Strom + Oberfläche (P 6, O 6, P 5, O 5)**		
65	Baufeld 10 (P 6, P 5)	41 Tage	Mo 19.03.18
66	Baufeld 11 (D 6)	16 Tage	Mo 14.05.18
67	Baufeld 12 (O 5)	16 Tage	Mo 04.06.18
68	Baumpflanzungen u. Anbringen Baumschutz für Neupflanzungen	21 Tage	Mo 11.02.19
69			
70	**Baufeld D = 130 m**	**675 Tage?**	**Mo 04.04.16**
71	Kanal (O 4 / O 5 und O 4 / P 4)	151 Tage	Mo 04.04.16
72	Wasser (O 4)	21 Tage	Mo 06.03.17
73	Fernwärme (P 3 / 14)	15 Tage	Mo 01.08.16
74	Fernwärme (P 3 / P 4)	65 Tage	Mi 01.03.17
75	Gas (P 3, O 4, O 5)	5 Tage	Mi 01.03.17
76	**Stadtbahnanlage (Gleis+Hst.) (P 5, O 5, P 4, O 4, P 3, O 3)**		
77	Gründung Fahrleitungsmaste (P 5, O 5, P 4, O 4, P 3, O 3)	26 Tage	Mo 29.05.17
78	Gleisarbeiten (P 5, O 5, P 4, O 4, P 3, O 3)	31 Tage	Mo 07.08.17
79	**Strom + Oberfläche (P 5, P 4, O 4, P 3, O 3)**		
80	Baufeld 15 (D 3)	16 Tage	Mo 03.09.18
81	Baufeld 16 (P 3)	21 Tage	Mo 24.09.18
82	Baufeld 17 (O 4)	21 Tage	Mo 22.10.18
83	Baufeld 18 (P 5, P 4)	34 Tage	Di 01.01.19
84	Baumpflanzungen u. Anbringen Baumschutz für Neupflanzungen	21 Tage	Mo 11.02.19
85			
86	**Baufeld E = 160 m**	**590 Tage?**	**Mo 01.08.16**
87	Wasser (O 1)	21 Tage	Mo 12.09.16
88	Fernwärme (P 1, P 2)	51 Tage	Mo 01.08.16
89	Fernwärme (O 2, O 3)	20 Tage	Mi 31.05.17
90	**Stadtbahnanlage (Gleis+Hst.) (P 3, O 3, P 2, O 2, P 1, O 1)**		
91	Gründung Fahrleitungsmaste (P 3, O 3, P 2, O 2, P 1, O 1)	16 Tage	Mo 26.06.17
92	Gleisarbeiten (P 3, O 3, P 2, O 2, P 1, O 1	46 Tage	Mo 11.09.17
93	**Strom + Oberfläche (P 3, P 2, O 2, O 1)**		
94	Baufeld 13 (O 2, O 1)	26 Tage	Mo 25.06.18
95	Baufeld 14 (P 3, P 2, P 1)	26 Tage	Mo 30.07.18
96	Baumpflanzungen u. Anbringen Baumschutz für Neupflanzungen	21 Tage	Mo 11.02.19
97			
98	**Baufeld E 1 / D 1 L= 70 m**	**38 Tage?**	**Mi 01.03.17**
99	Strom + Oberfläche (E 1 / D 1)		
100	Baufeld 1 (D 1)	19 Tage	Mi 01.03.17
101	Baufeld 2 (E 1)	21 Tage	Mo 27.03.17
